

親愛的弟兄姊妹主內平安：

梁鴻光函（七十一）

寫這信的時候，我已回到香港。謝謝您的代禱，我在10月29日晚上抵達香港，辦理入境手續及取得病毒檢測陰性報告後，於11:15到達酒店，開始21天的檢疫隔離生活。

自確定十月底離開泰國的日期後，除了要辦理符合入境的各項要求與文件外，也開始調節身心。畢竟在泰國生活這九個月，生活十分規律，每天生活就是在民宿食「豆漿麥皮」，然後往街上小店食粥，之後往聖經學院跟進工程，中午大多在學院與師生一起用膳，然後繼續工作，又或外出前往不同的傢俱店及建材店選擇合適的傢俱及材料。晚上大多外出晚膳（受疫情影響，許多店鋪都休業了，我差不多固定地去一間雲南飯店），飯後返回宿舍休息。人在泰國，每天不忘看泰國中文報刊網上版，了解泰國的疫情及社會動態，反倒少看了香港的新聞，甚至以往在香港的日常都忘記了，就如少了用網上銀行，竟連登入密碼也想不起來！由於過著地道的泰國生活，因此，在離開泰國前就先來調整一下。十月初，開始清理宿舍物品，也刻意作些改變過渡，例如中午不在聖經學院用膳，晚飯也改去其他飯店。離開泰國之時確實感到不捨，包括人、事和物！

新天聖經學院第二期工程的進展與上封信提及的內容稍有落差，與承建商了解後發現原因有幾方面：1) 泰國文化慣常做事悠閒的心態及「沒關係」的個性特徵，正是「你急佢唔急」！承建商理解我做事情的要求，所以近期已向他公司的行政人員訓示：「梁牧師要求要做的事，要立刻做，不要等！」只是，文化不是一天就可以改變了，我們都受文化影響，受到一定的衝擊。2) 十月份有較多假期，有些分判商開心放假去。3) 今年十月較以往多雨水，地上泥土經常濕透，影響戶外園景工程的進度。4) 很多材料需由外府（省）訂購，但由於準備工夫不足，計算數量出了差距，待材料用盡了，發現不夠才再去訂購，工程就只好停下來，待十多天後材料運抵才再開工。這總總原因致令工程時間又再延長了。



圖景：最後施工範圍

離開泰國前，另又完成了一些裝置項目，訂制「命名捐獻」的牌匾（第一及第二期）、「榮譽贊助人」的名牌、房間與洗手間的指示牌等，還有別的指示牌及其他事宜，則待稍後合適時間再往泰國時才能處理。由於工程進度未如理想，回港後仍需協助跟進現時進行中的項目，當然會有限制及困難，總不及在現場的監督。為此，已將相關事宜請李光平牧師協助處理。


第二期建校工程修訂後的總預算為泰幣5,900萬銖，感謝神，截至2021年10月31日止，共收奉獻5,535萬銖，距預算尚欠泰幣364萬銖（港幣104萬／美金13萬）。在此再次多謝各位主內肢體及教會的愛心奉獻和不斷禱告。

回港後要處理辦事處累積的事務，尤其是會計賬目，抱歉因人在泰國，未能每月發出「奉獻收據」。個人方面要作身體檢查、配眼鏡等，當然也要協助「家務」。

「願他們以感謝為祭獻給祂，歡呼述說祂的作為！」（詩篇107:22）



電梯已裝妥  
待鋪牆磚

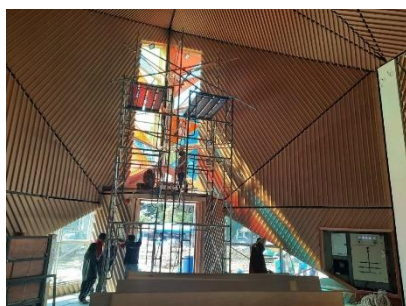

禮堂安裝了彩色玻璃



這部份地面已鋪了磚及草

您的弟兄 梁鴻光

2021年11月1日
